ALSACE
Collectivité européenne

# Direction des Routes, des Infrastructures et des Mobilités

Service Routier de Saint-Louis

## RD 103 et 7 bis dans MANSPACH

Travaux de réfection de la couche de roulement (pose d'enrobés) entre les PR :

- 19+150 et 19+810 (RD 103)
- 0+000 et 0+052 (RD 7 bis)

du 25 au 28 octobre 2021

Dossier validé le : 18/10/2021

par :

Jean-Michel CLAUDEL
Adjoint Exploitation Service Routier de Saint-Louis

# SOMMAIRE

1. Liste des pièces obligatoires

2. Descriptif des travaux

2.1. Descriptif

2.2. Restrictions de circulation

2.2.1. Secours

2.3. Intervenants

2.4. Données sur le trafic 2019

2.5. Planning des travaux

3. Plans de situation des travaux

4. Plans des restrictions de circulation

4.1. Déviation axe Dannemarie – Romagny

4.1.1. Signalisation

4.1.2. Signalisation itinéraire bis pour les VL

4.2. Déviation axe Dannemarie – Altenach

4.2.1. Signalisation

4.3. Pré-signalisation

5. Communication auprès des élus, des partenaires (communes…) et des riverains

5.1. Information des usagers avant la phase chantier

5.2. Information durant la phase chantier

5.3. Copie du texte envoyé aux élus concernés par une déviation

6. Communication auprès des médias et réseaux sociaux

7. Liste des destinataires

# 2 – Travaux

## 2.1 - Descriptif :

La CeA a décidé de reprendre la couche de roulement en agglomération de Manspach sur les sections suivantes :

- RD 103 du pr 19+150 (OA sur la Largue) au 19+810 (panneau d'agglomération côté Romagny) ;
- RD 7 bis du pr 0+000 (intersection avec la RD 103) au 0+052 (OA sur le Krebsbach).

Les travaux consisteront à :

- Fraiser les anciens enrobés ;
- Poser les enrobés sur une épaisseur de 6 cm.

## 2.2 - Restrictions de circulation :

Compte-tenu du trafic, de la consistance des travaux, de la configuration des lieux et à la demande de l'entreprise, il est décidé de fermer la route à la circulation pendant la durée des travaux et de mettre en place deux déviations qui emprunteront dans les deux sens :

- Les RD 103, 32, 32 II et 419 via Romagny, Magny, Montreux-Jeune, Montreux-Vieux, Valdieu-Lutran, Retzwiller et Dannemarie. Les VL pourront toutefois emprunter la RD 32 I entre Romagny et Valdieu-Lutran ;
- Les RD 7 bis, 16 et 419 via Altenach, Saint-Ulrich, Mertzen, Fulleren, Carspach et Dannemarie.

### 2.2.1 – Secours

L'ensemble du chantier restera accessible aux engins de secours en cas d'intervention dans l'emprise des travaux. Durant les périodes hors travaux (nuits), l'entreprise prendra ses dispositions afin de permettre l'éventuelle circulation d'engins de secours.

## 2.3 - Intervenants :

Les travaux seront réalisés par l'entreprise « Colas » (68120 Pfastatt).

La signalisation de la déviation sera assurée par le centre d'entretien et d'intervention d'Altkirch (CeA /Service Routier de Saint-Louis).

**Dossier d'Exploitation**

## 1 – Liste des pièces obligatoires

| | | Observations éventuelles |
|---|---|---|
| Données de trafic | ☒ | * |
| Plan de situation | ☒ | * |
| Dates prévues | ☒ | * |
| Description synthétique | ☒ | * |
| Mode d'exploitation | ☒ | * |
| Justification | ☒ | * |
| Impact sur les usagers | ☒ | * |
| Schéma de signalisation | ☒ | * |
| Carte des déviations | ☒ | * |
| Lettre d'information aux élus Concernés par les travaux | ☒ | * |
| Liste des destinataires | ☒ | * |
| Comptes rendus concertation Copie des lettres de réponse des Maires et conseillers sollicités | ☐ | * |
| Recommandations de sécurité | ☐ | * |
| Modèle de panneaux d'information Aux usagers de la route | ☒ | * |
| Pièces transmises à la Com | ☒ | * |
| Demande de réglementation | ☒ | * |

## 2.4 - Données sur le trafic 2019 :

Trafic TV

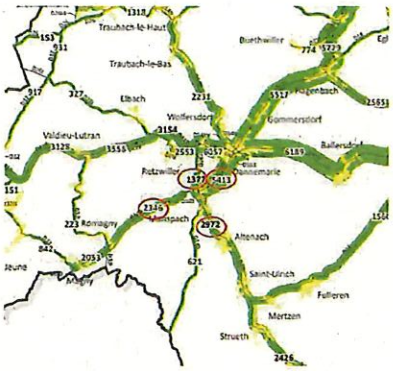


Trafic PL

## 2.5 - Planning des travaux :

À l'heure actuelle, ces travaux sont programmés du 25 au 28 octobre 2021, mais ils sont susceptibles d'être décalés dans le temps en fonction des aléas météo.

# 3 - Plans de situation des travaux

*Situation éloignée*

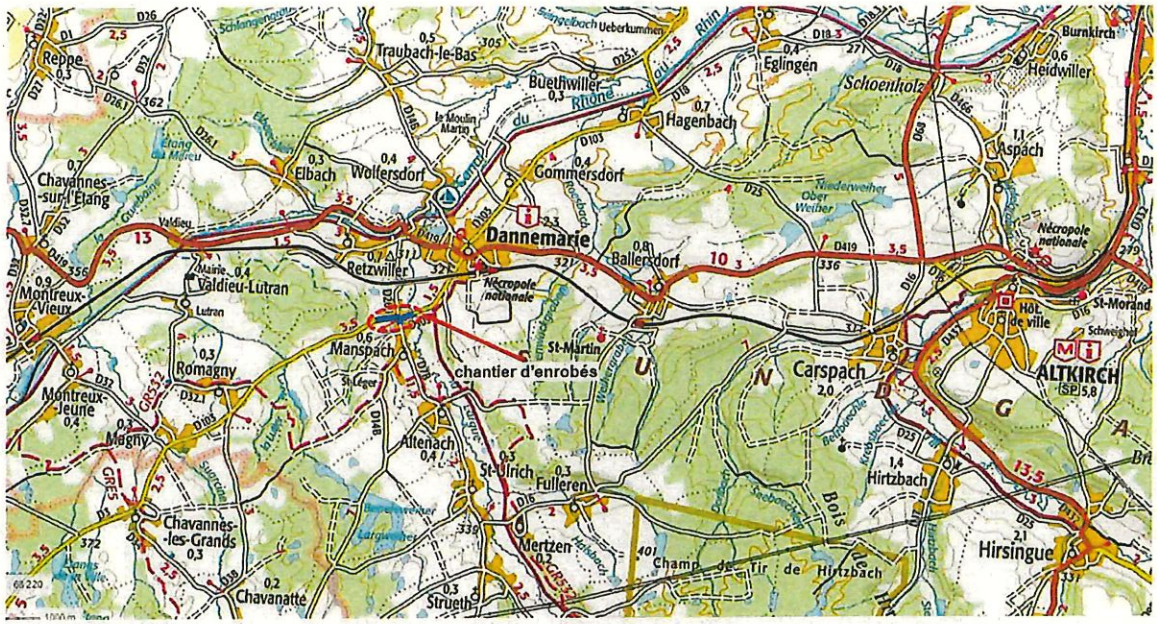

*Situation proche*

## 4 - Plans des restrictions de circulation

Les déviations mises en place à l'occasion de ces travaux emprunteront dans les deux sens :

- Pour la RD 103 sur l'axe Dannemarie - Romagny :
  - la RD 103 via Romagny et Magny ;
  - la RD 32 via Magny, Montreux-Jeune et Montreux-Vieux ;
  - la RD 32 II via Montreux-Vieux ;
  - la RD 419 via Valdieu-Lutran, Retzwiller et Dannemarie.
  - Une déviation uniquement pour les VL pourra emprunter la RD 32 I entre Romagny et Valdieu-Lutran.

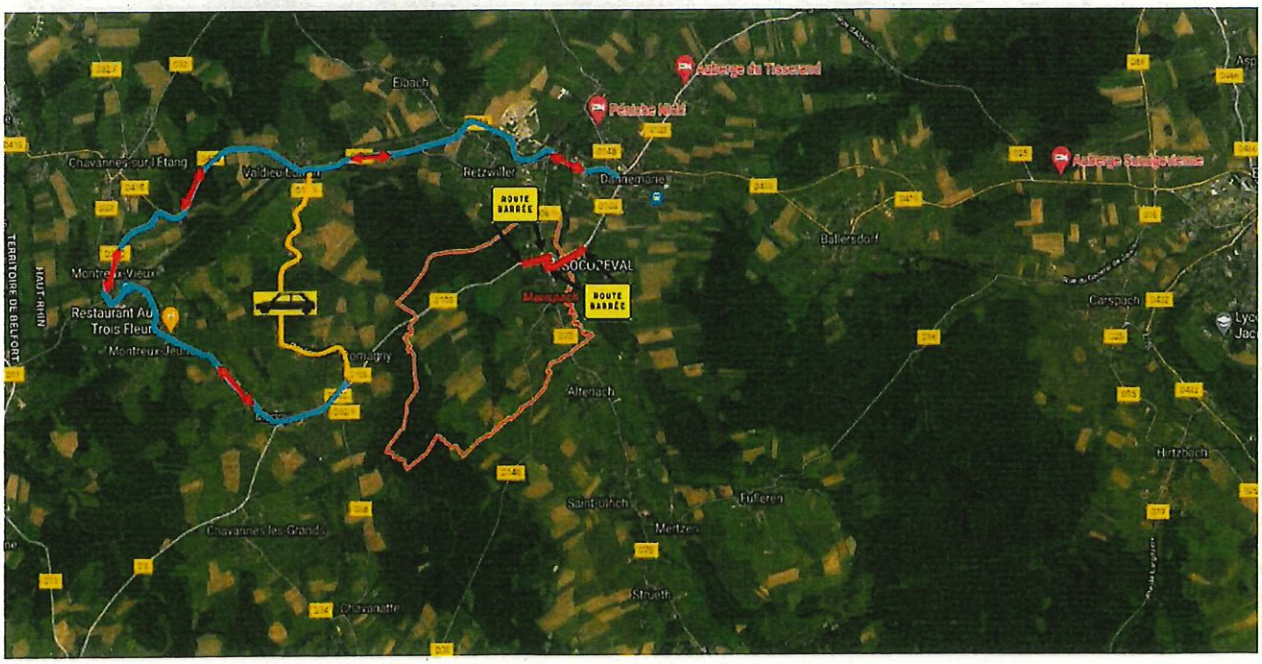

- Pour la RD 7 bis sur l'axe Dannemarie – Altenach :
  - la RD 7 bis via Manspach, Altenach, Saint-Ulrich et Mertzen ;
  - la RD 16 via Mertzen, Fulleren et Carspach ;
  - la RD 419, via Dannemarie.

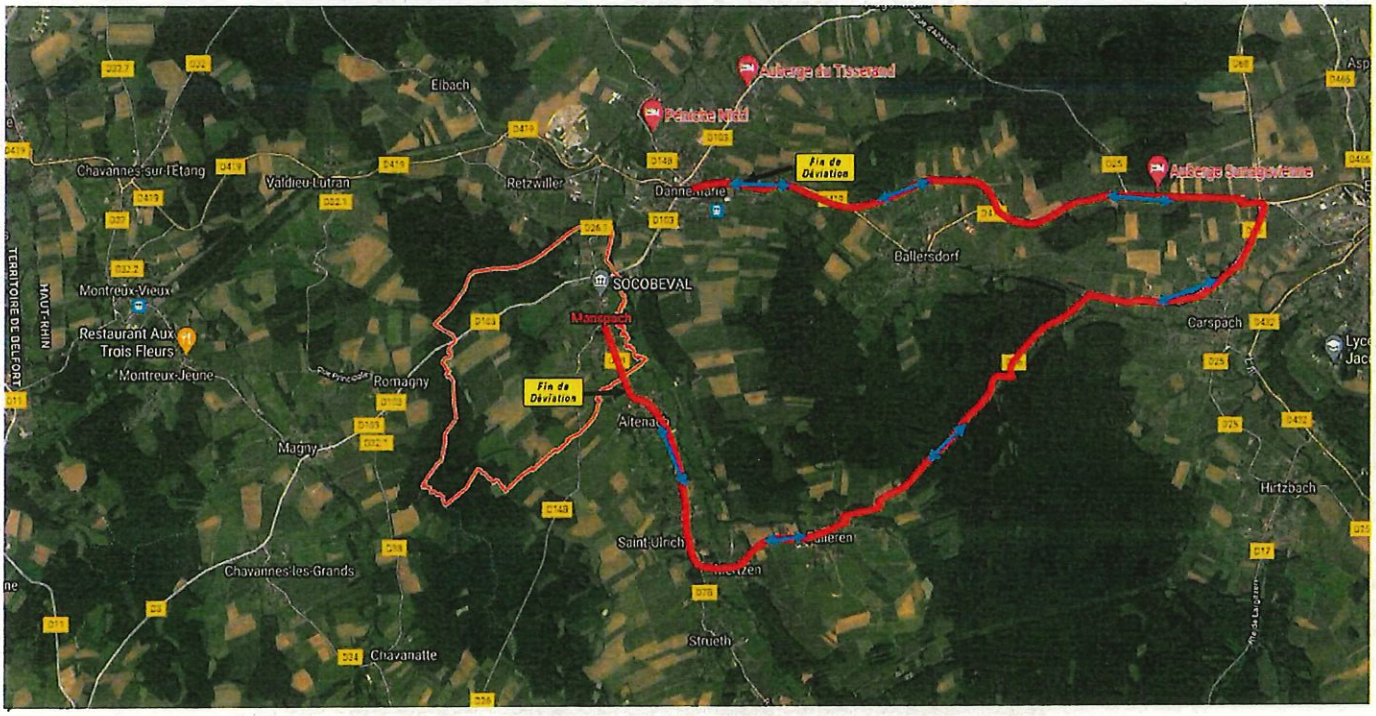

## 4.1 - Déviation axe Dannemarie - Romagny :

### 4.1.1 - Signalisation

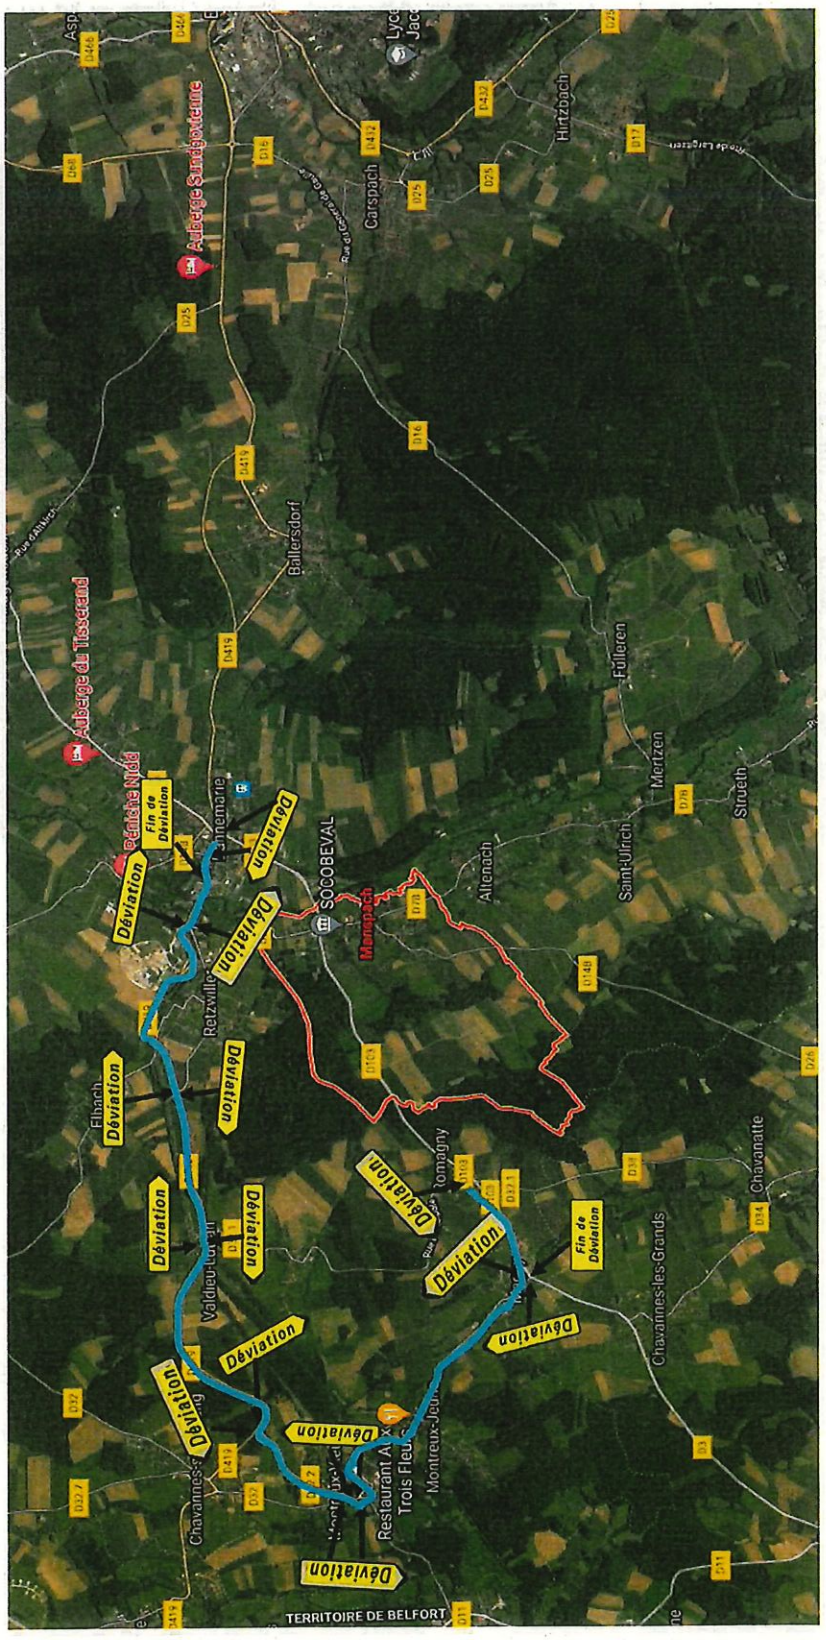

## 4.1.2 - Signalisation itinéraire bis pour les VL :

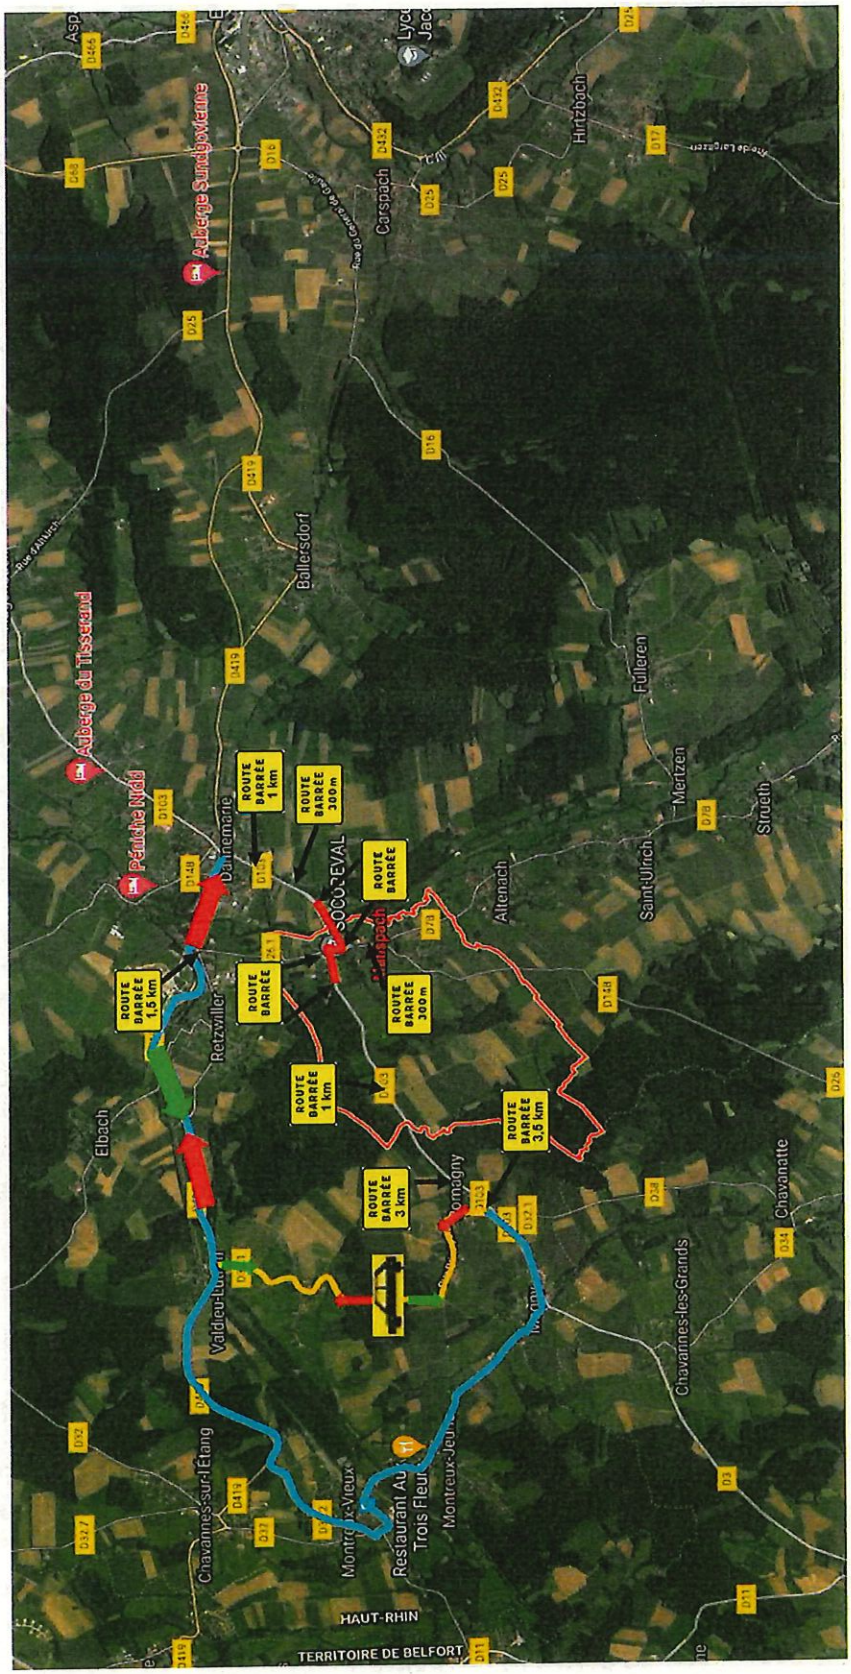

## 4.2 - Déviation axe Dannemarie - Altenach :

### 4.2.1 - Signalisation

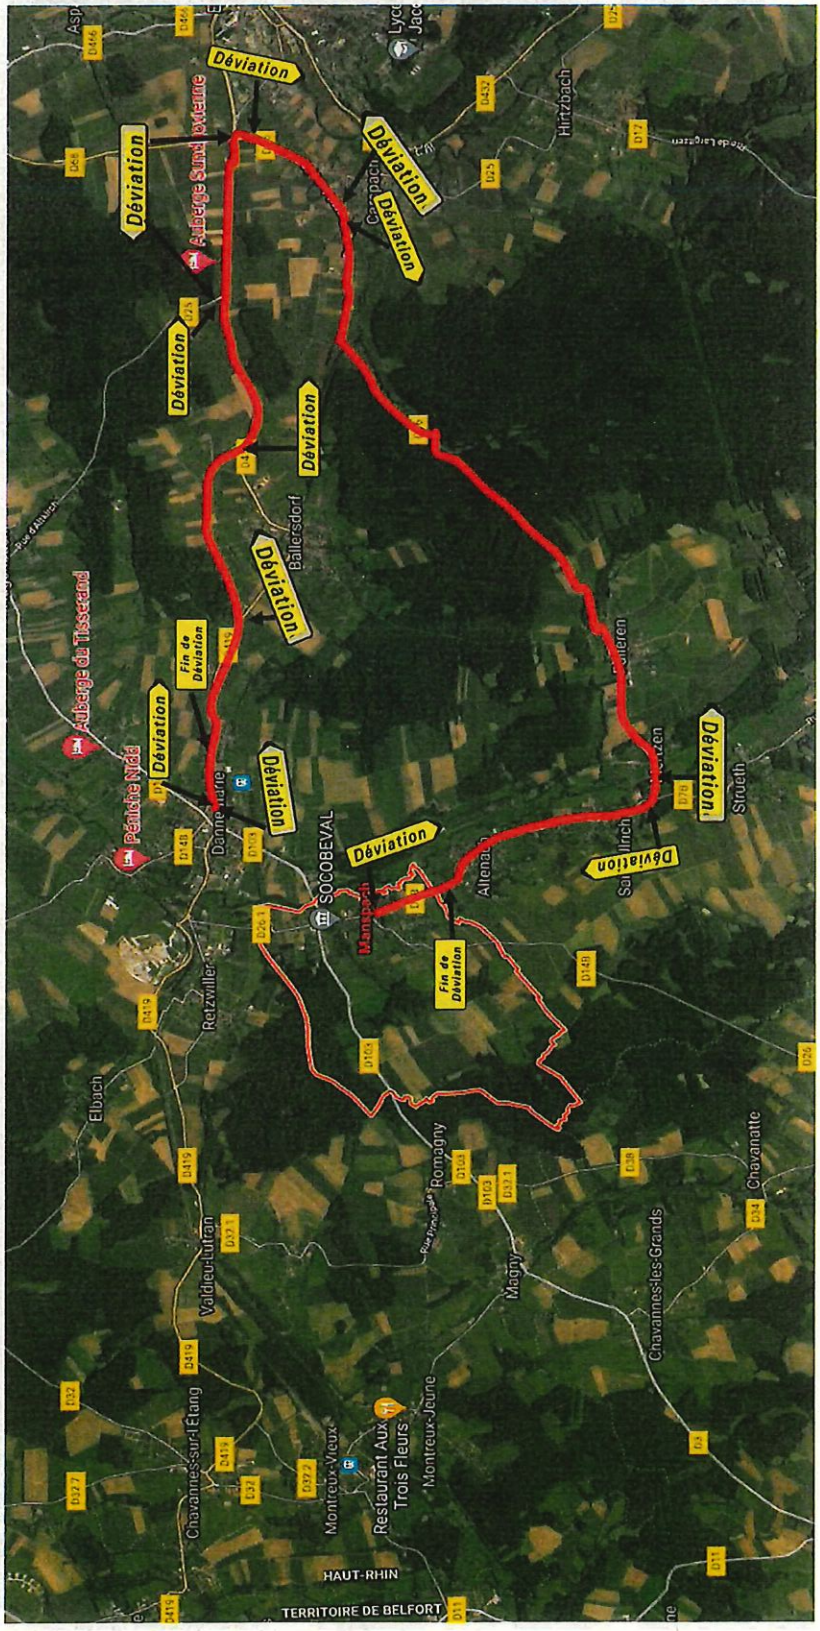

## 4.3 – Pré-signalisation

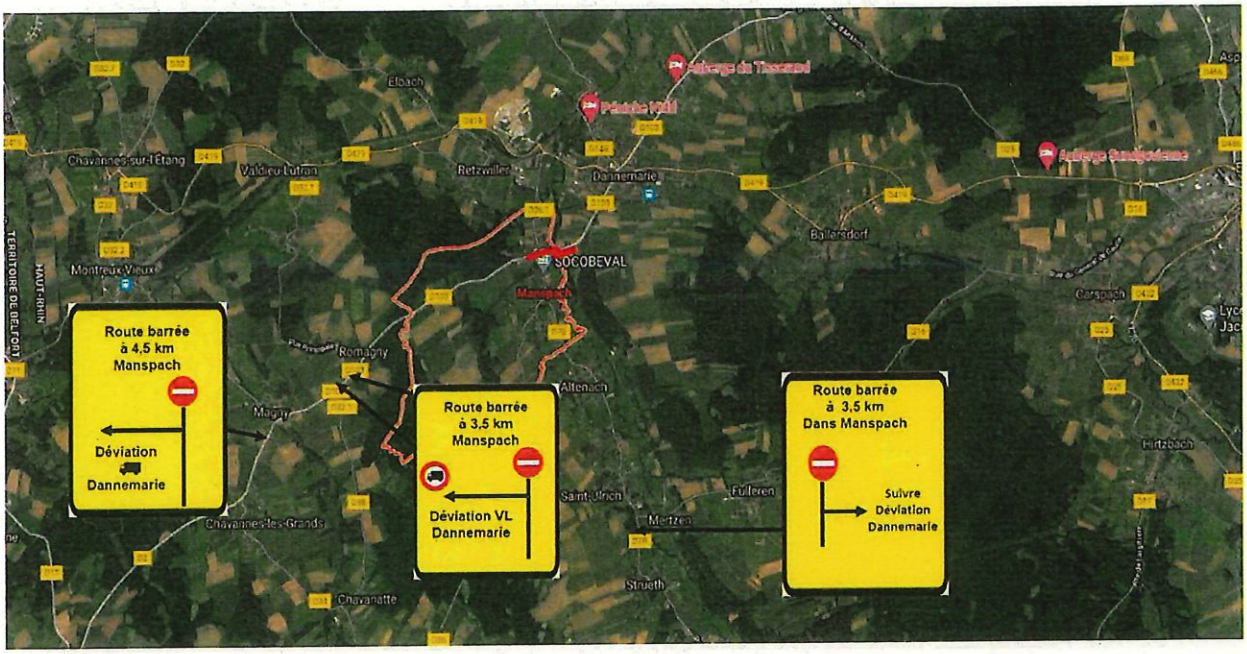


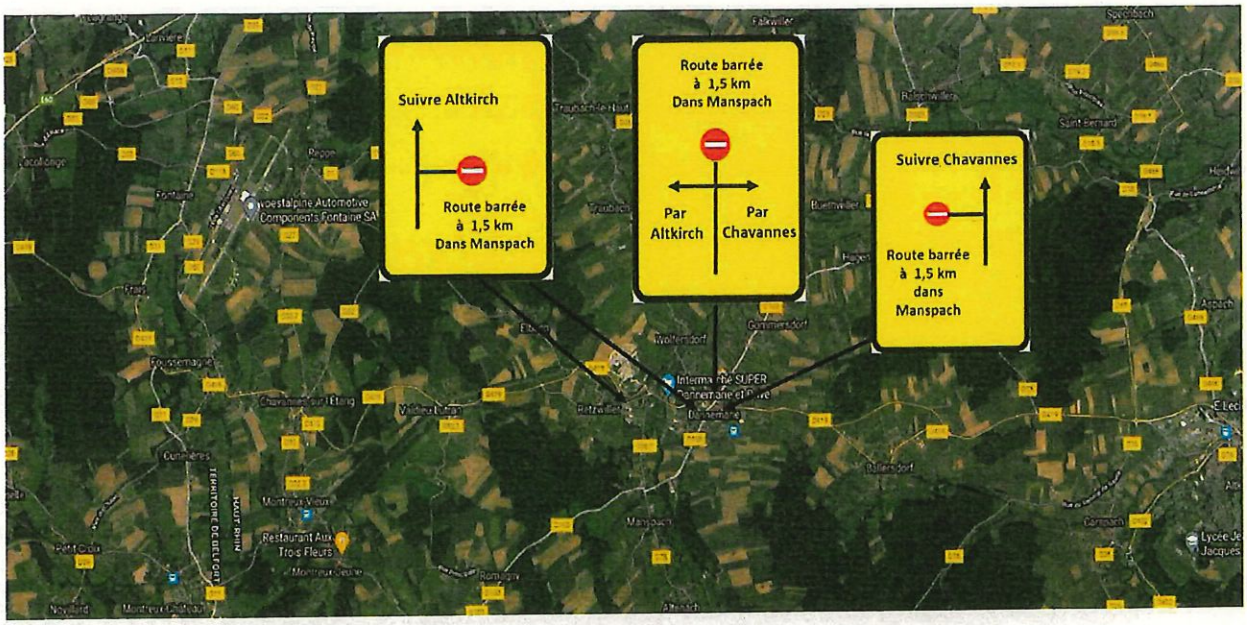

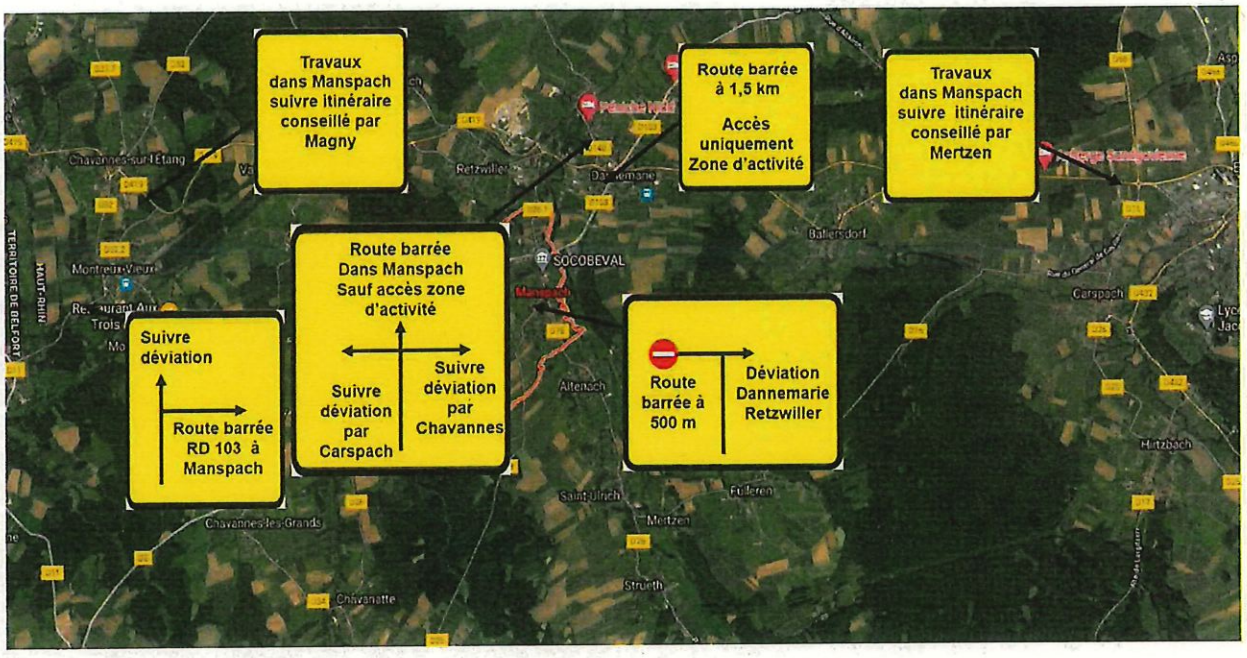


# 5 - Communication auprès des élus et des usagers

## 5.1 – Information des usagers avant la phase chantier :

Avant les travaux, les usagers seront informés par la mise en place de panneaux d'information selon le plan ci-dessous

### 5.2 – Information durant la phase chantier :

Les usagers seront informés par la mise en place de panneaux aux extrémités de la section et à différentes intersections en amont du chantier selon les schémas de pré-signalisation (§ 4.3).

### 5.3 – Copie du texte envoyé aux élus concernés par une déviation :

Monsieur le Maire,

La CeA a prévu cette année de renouveler de la couche de roulement par la mise en œuvre d'enrobés en traversée de Manspach sur les RD :

- 103 du pr 19+150 (OA sur la Largue) au 19+810 (panneau d'agglomération côté Romagny) ;
- 7 bis du pr 0+000 (intersection avec la RD 103) au 0+052 (OA sur le Krebsbach).

Au vu de la configuration des lieux et du trafic, il a été décidé de mettre en place deux déviations, dont l'une passant par votre commune.
À l'heure actuelle ce chantier est prévu du 25 au 28 octobre 2021.
Veuillez ainsi trouver ci-joint les schémas indiquant les modalités de gestion du trafic envisagées pour ces travaux.
Je vous remercie par avance, de bien vouloir m'adresser toutes les remarques que vous jugerez utiles ou votre avis par retour de mail d'ici le 18 octobre 2021.
***Passé ce délai, sans réponse de votre part, il sera considéré que ce document sera accepté en l'état.***

## 6 - Communication auprès des médias et réseaux sociaux

### Copie du texte proposé pour diffusion :

La Collectivité européenne d'Alsace envisage d'effectuer une opération de renouvellement de la couche de roulement par la mise en œuvre d'enrobés en traversée d'agglomération de Manspach du 25 au 28 octobre 2021 sur la RD 103 et une petite partie de la RD 7 bis.

Ces travaux nécessiteront une fermeture de cette section sur cette période.

Deux déviations seront mises en place dans les deux sens par Romagny, Magny, Montreux-Jeune, Montreux-Vieux, Valdieu-Lutran, Retzwiller et Dannemarie d'une part (RD 103, 32, 32 II, et 419) et Manspach, Altenach, Saint-Ulrich, Mertzen, Fulleren, Carspach et Dannemarie d'autre part (RD 7 bis, 26 et 419).

# 7 - Liste des destinataires

Ci-dessous une liste non exhaustive des partenaires à consulter :

- MM. les Maires des communes de Manspach, Romagny, Magny, Montreux-Jeune, Montreux-Vieux, Valdieu-Lutran, Retzwiller, Dannemarie, Carspach, Fulleren, Mertzen, Saint-Ulrich et Altenach ;
- MM. les Chefs de corps des Sapeurs-Pompiers des communes de Manspach, Romagny, Magny, Montreux-Jeune, Montreux-Vieux, Valdieu-Lutran, Retzwiller, Dannemarie, Carspach, Fulleren, Mertzen, Saint-Ulrich et Altenach ;
- M. le commandant du SDIS ;
- M. le commandant de la Brigade de Gendarmerie de Dannemarie ;
- SAMU ;
- CORG ;
- Région Grand Est - Cellule Transports Scolaires : transports68@grandest.fr ;
-
